

星天ニュース

第17号

発行日：平成22年10月18日

発行：横浜市道路局

編集：相模鉄道株式会社

～相鉄線の連続立体交差事業のお知らせです。～

日頃より、相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差事業にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。今回は現在までの工事進ちょく状況等についてお知らせします。

星川1番線の線路切替え工事について

切替え工事が無事完了しました。

平成22年9月24日（金）夜間から9月25日（土）早朝にかけて、星川駅1番線（下り待避線）の線路を北側に切替える工事を実施しました。（裏面図-②参照）当日は天王町3号踏切付近～星川1号踏切付近において約350人の作業員により、星川1番線のホーム縮小、線路切替え、架線や信号設備などの切替え、調整等の工事を実施しました。（写真-①～③参照）



ホーム縮小箇所

写真-① 星川駅下りホーム縮小作業
（星川駅1番線ホームより横浜方を望む）



写真-② 人力によるレールの振込み作業
（星川駅1番線より海老名方を望む）



写真-③ 架線切替え調整作業
（星川駅1番線より北側を望む）

当日の夜は沿線にお住まいの方々にご迷惑をおかけしましたが、無事作業を完了することができました。あらためて深く感謝いたします。この切替えにより、既設の線路が全て北側に移設されたこととなります。

今後は切替え前に使用していたレールや架線などを撤去し、本設高架橋の施工に入る予定です。また、天王町3号踏切と星川1号踏切の踏切長を短くする工事を実施します。（下表参照）

踏切道名	踏切長：m （現在→縮小後）	備考
天王町3号踏切	24.3→17.3	11月中旬 夜間縮小予定
星川1号踏切	14.6→8.4	10月下旬 夜間縮小予定

高架橋の柱の施工が進んでいます。


現在、天王町2号～3号踏切の南側に設置する高架橋の柱の構築準備を進めています。(写真-④、図-②参照) 今年度末までに同区間においては約30本の柱が立ち上がる予定です。また、星川駅のホーム中央部においては、1～2番線をまたぐ形で高架橋の鉄骨の架設を進めていきます。(図-①、②参照)



写真-④ 高架橋の躯体構築状況
(天王町2号～3号踏切間南側から横浜方を望む)



図-① 星川駅1・2番線ホームイメージ図
(星川駅下りホーム中央部から海老名方を望む)

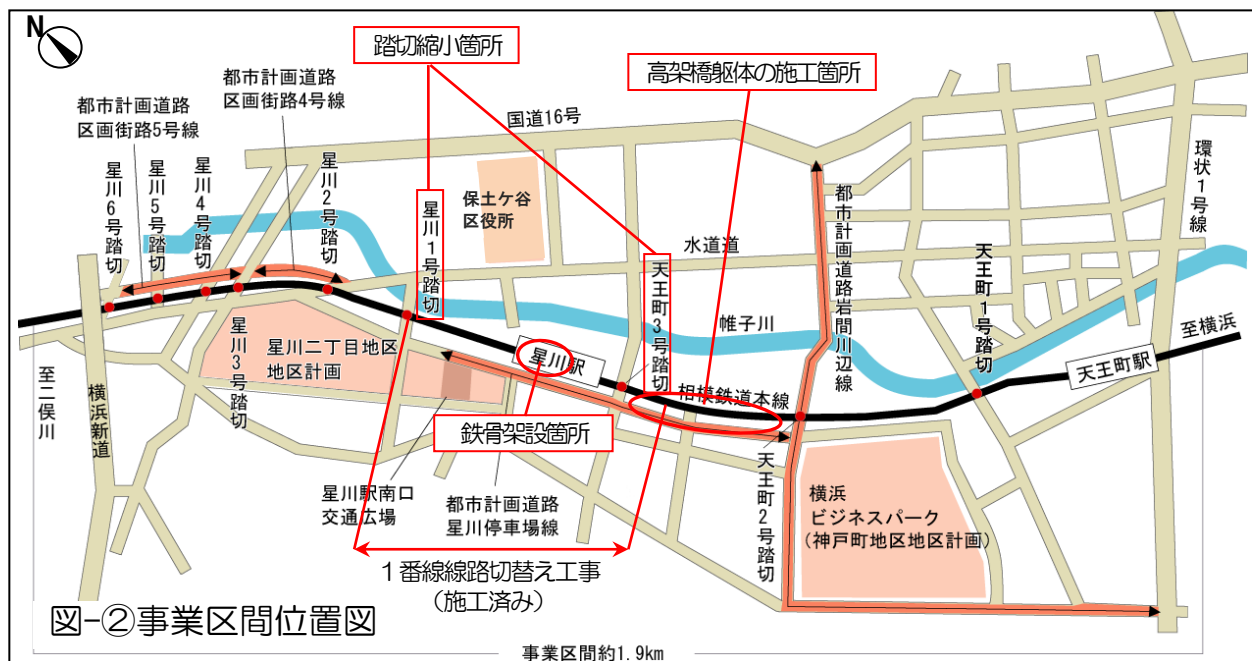

～お知らせ～

星天ニュースは横浜市ホームページでダウンロードすることができます。

横浜市 星天ニュース

連続立体交差事業に関する「現在の工事状況」や「お知らせ」は相模鉄道株のホームページでご覧いただけます。

相鉄 連続立体交差工事

～お問合せ～

- 事業に関するお問合せ……横浜市 道路局 計画調整部 企画課 鉄道交差調整担当
Tel 045 (671) 2792
- 工事に関するお問合せ……相模鉄道株式会社 星川・天王町駅付近連続立体交差工事事務所
Tel 045 (335) 6733
