

日頃より、相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差事業にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。現在の工事状況等についてお知らせいたします。

## 仮上り線への線路切替え工事が無事完了しました

以前よりお知らせしてまいりました、上り線の線路を仮の線路へ切替える工事が、平成19年11月2日（金）から3日（土）にかけての夜間作業により、無事完了いたしました。

当日は、工事区間内の5箇所における軌道の切替えや架線の調整（写真①、②、③参照）、また、新しい信号機への切替えや星川駅上りホームの拡幅などを行いました。大勢の作業員による工事であったため、沿線にお住まいの方にはご迷惑をおかけしましたが、皆様のご協力により無事予定通りの作業を実施することができました。あらためて深く感謝いたします。

線路を切替えながら高架化する当事業は、今回の線路切替えにより、着実にひとつの段階を進捗したこととなります。当面の予定としましては、平成20年3月末に星川駅が仮の駅舎に切替わります。その後、既存の駅舎の解体や拡幅した上りホームの下で仮3番線の線路の敷設を行い、平成20年11月頃に仮3番線と上りホームの切替えを予定しています。

今後の工事につきましても、引続き本紙等によりお知らせしてまいります。



写真① 人力での軌道接続作業：天王町1号踏切付近  
（平成19年11月撮影）



写真② 軌道の切替えに伴う架線調整作業  
（平成19年11月撮影）



写真③ 切替え箇所を走行する試運転列車  
：星川6号踏切付近（平成19年11月撮影）

### ～お知らせ～

相模鉄道株のホームページでも、連続立体交差事業に関する「現在の工事状況」や「事業に関するお知らせを」をご覧ください。こちらをあわせてご利用ください。

ホームページアドレス：

<http://www.sotetsu.co.jp/train/crossover/>

## 星川仮駅舎・仮こ線橋（自由通路）工事も進んでいます

星川駅の仮駅舎と仮こ線橋（自由通路）は、平成20年3月末の使用開始を目指し工事を進めています。12月1日からは現在の駅舎と星川SFビルを連絡する通路を閉鎖させていただいております。これは、閉鎖した連絡通路を撤去し、あらたに道路上空をまたぐ仮こ線橋（自由通路）を星川SFビルのペデストリアンデッキにつなぎ、仮駅舎南口を設けるものです（図-①、写真-④、⑤参照）。星川駅をご利用の際は、駅南口階段、駅北口階段・エレベーターをご利用ください。仮駅舎と仮こ線橋（自由通路）を使用開始するまでの約4ヶ月間、大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

来年1月には仮こ線橋（自由通路）を架け、その後仮駅舎の建物工事や仮駅舎内の鉄道設備工事を行います。

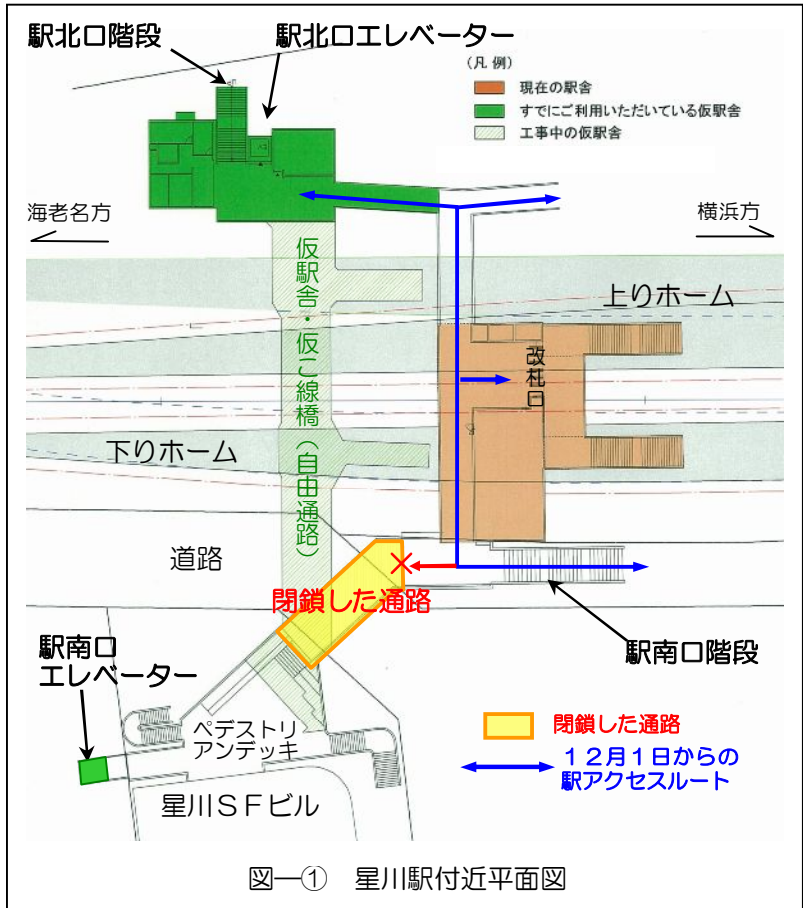


写真-④ 閉鎖した星川SFビル連絡通路  
(平成19年12月撮影)

エレベーター、12月3日からご利用いただいている星川SFビル・ペデストリアンデッキにつながる駅南口エレベーターにより、駅のバリアフリー化が図られます。

仮駅舎・仮こ線橋（自由通路）の使用開始日程につきましては、決定次第別途ご案内いたします。

また、11月に拡幅した上りホームの屋根や上りホームと仮駅舎をつなぐ階段の設置工事も、3月末の使用開始に間に合うように進めてまいります。

3月末からご利用いただく仮駅舎では、ホームとコンコース（改札内通路）をつなぐエレベーターがご利用いただけることになり、既にご利用いただいている北口



写真-⑤ 撤去作業の進む星川SFビル連絡通路  
(平成19年12月撮影)

### ～お問合せ～

- 事業に関するお問合せ …… 横浜市 道路局 計画調整部 鉄道交差調整担当  
Tel 045 (671) 2792
- 工事に関するお問合せ …… 相模鉄道株式会社 鉄道カンパニー  
星川・天王町駅付近連続立体交差工事事務所  
Tel 045 (335) 6733
