

日頃より、相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差事業にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。今回は現在までの工事進捗状況（天王町3号踏切部の高架橋工事、星川駅1番線の線路切替え工事、星川駅部の高架橋（鋼製）の製作状況）についてお知らせします。

高架橋の柱の工事について

天王町3号踏切部の高架橋の工事をしています。

現在、星川駅下りホームの横浜方において、天王町3号踏切上部をまたぐ高架橋の工事をしています。5月21日（金）と6月7日（月）の夜間に鋼製の柱を建てる工事、及び梁の一部を架ける工事を行いました（写真-①、②参照）。今後は、星川駅の1番線切替え後に南側の柱の施工に入る予定です。



写真-① 天王町3号踏切の高架橋柱の状況
（天王町3号踏切から海老名方を望む）

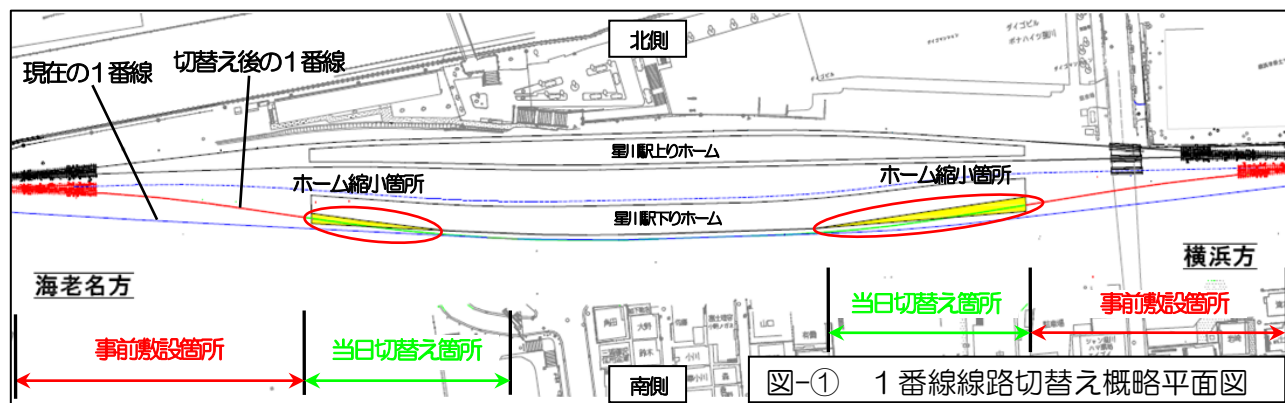


写真-② 天王町3号踏切の高架橋梁の架設状況
（天王町3号踏切から海老名方を望む）

星川駅1番線の線路切替え工事について

星川駅1番線線路の切替えに伴う準備工事をしています。

本年度の秋に星川駅の1番線を北側へ移動させる工事を予定しています。電車の往来に支障しない箇所の線路は事前に敷設しておき、切替え当日の夜間に下り線ホームの幅を縮小し、線路をそれぞれ北側に振り、事前に敷設しておいた線路と接続します。この切替えにより、既設の線路が全て北側に移設されたこととなります（図-①参照）。



星川駅部の高架橋（鋼製）の製作について

👉 工場で星川駅部の高架橋の製作が進んでいます。


現在、工場にて星川駅部の高架橋の製作が進んでいます（写真-③、④参照）。工場では各パーツに加工された鋼材を溶接やボルトで仮に組立て、実際に現場で組み立てられるかを事前に確認します。仮組立の確認を行った後、現場に搬入され架設されます。



写真-③ 星川駅部高架橋仮組立状況



写真-④ 星川駅部高架橋柱仮組立状況

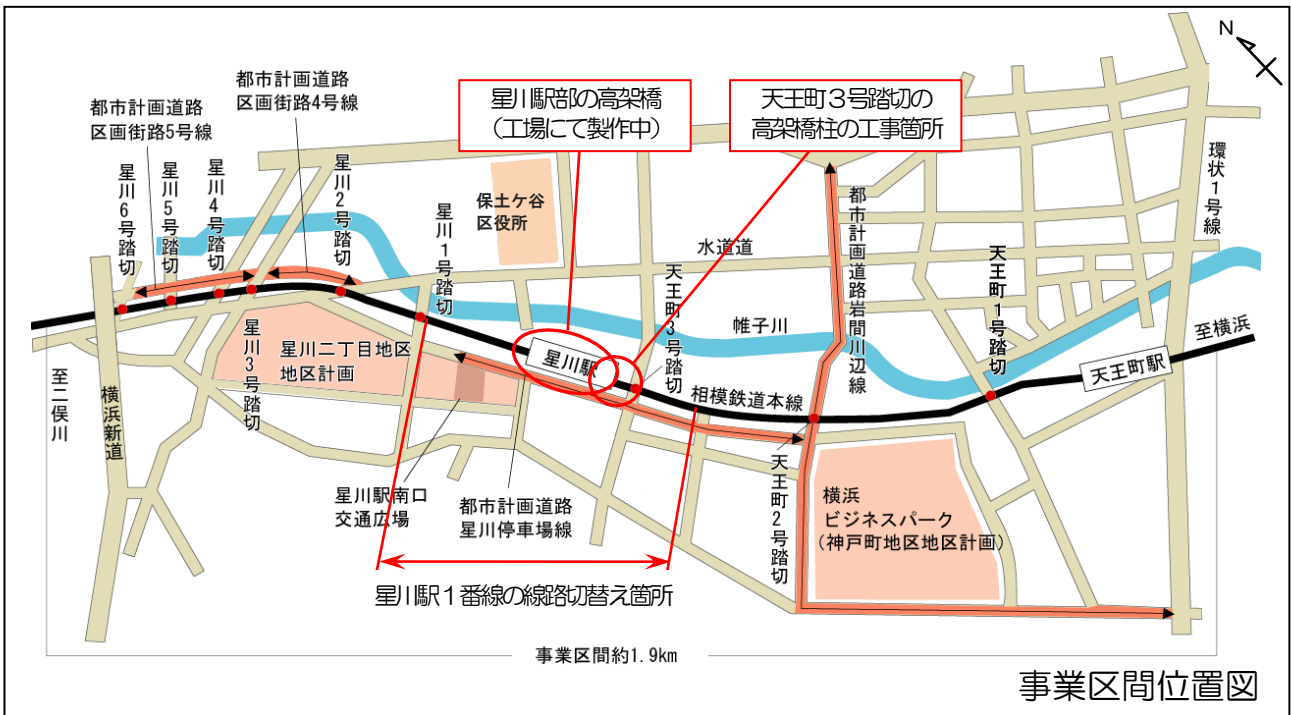

事業区間位置図

～お知らせ～

星天ニュースは横浜市のホームページでダウンロードすることができます。

横浜市 星天ニュース

連続立体交差事業に関する「現在の工事状況」や「お知らせ」は相模鉄道株のホームページでご覧いただけます。

相鉄 連続立体交差工事

～お問合せ～

- 事業に関するお問合せ……横浜市 道路局 計画調整部 企画課 鉄道交差調整担当
Tel 045 (671) 2792
- 工事に関するお問合せ……相模鉄道株式会社 星川・天王町駅付近連続立体交差工事事務所
Tel 045 (335) 6733
