

星天ニュース

～相鉄線の連続立体交差事業のお知らせです。～

第21号

発行日：平成23年9月26日
発行：横浜市道路局
編集：相模鉄道株式会社


日頃より、相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差事業にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。今回は工事進捗状況と事業計画の変更についてお知らせします。

完成目標を平成30年度に変更します

星川駅～天王町駅間の連続立体交差化は、平成14年9月の事業認可（都市計画）取得後、平成24年度の完成を目標に進めてきましたが、このたび、踏切や駅の安全対策、工事中の環境対策等の追加工事が必要になったこと、さらに、用地取得の遅れにより、**完成目標を平成30年度（6年間の延長）に変更**することになりました。今後は、平成30年度の完成目標が、1日でも早くなるよう検討を進めていきます。近隣にお住まいの方や駅を利用されている方には、多大なご不便をおかけしますが、ご理解くださるようお願いいたします。

また、1.9kmの区間にわたる耐震や景観対策による鉄道構造物の変更、法改正に伴う駅のバリアフリー化等の追加工事により、事業費は約90億円、増加することになりました。今後は、相模鉄道と共に一層の事業費削減が図れるよう、努めていきます。

星川駅の完成イメージができました

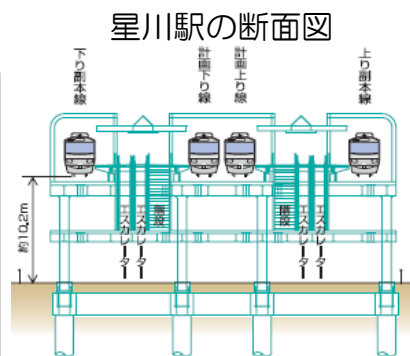

※ イメージパースについては計画であり、変更になることがあります。

